


桜、花桃、木蓮などが一斉に咲いていた連休も終わり、山は新緑の季節になっていました。今回の作業は大きな梁に床を作って、8畳間ほどのロフトを増設。天井と壁面の断熱材を設置してOSB材で仕上げを行います。

5月14日(火) 松田を5時に出発、R246(5:30) 河口湖(6:00) R20(6:45) 須玉(7:45) 野辺山(8:10 10°C) 八千穂(8:40) 山荘9時30分着 (4時間30分) 天候も良く道も空いていました。林道から山荘に入る坂道で杉の倒木があり、軽トラックが通過できないので、チェーンソーで玉切りにして山荘まで運搬。風が吹くと弱っている樹木が倒れてくるので、これからも整備が必要になります。半年ほど乾燥させれば良い薪になります。兜岩山の頂上付近はまだ、樹木に葉が着いていませんが、少し下がったところからは新緑が頂



上に向けて登っていくところです。荷物を下ろして、場内を点検。ログハウスの清掃を行い軽く(パン) 昼食を取りました。午後からは明日から作業する、ロフト用のに24mmのコンパネ(床材)を「与志本プレカットセンター」受け取りに行きます。14時ごろに材木屋さんに着くと早速、フォークリフトでコンパネを8枚軽トラックに積み込んで、その他に断熱材や床材、床ボンドなどを頂いてきました。(助かります)

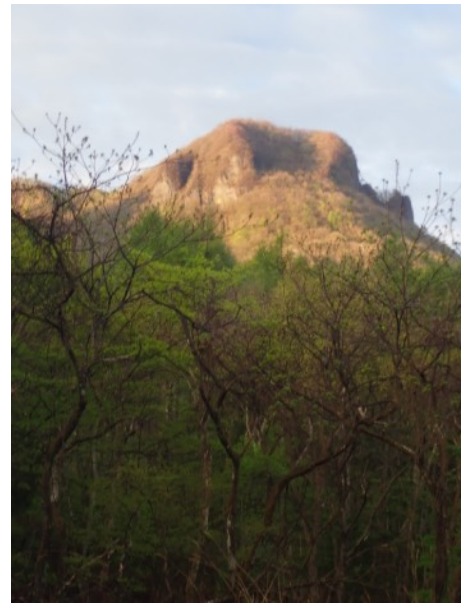

帰り道に食材や雑貨類の買い出しをして山荘に戻ると、17時。市内は少し雨が降っていましたが、山荘は雲の中に居るような感じでした。雨になるといけないので、軽トラックの荷物をホール内に荷下ろしして、今日の作業は終了です。夕食はおにぎりビールで軽く済ませて、21時には就寝。朝が早かったのでよく眠れます。




5月15日(水) 5時30分起床 外気7℃ 室内20℃ はれ

朝もだいぶ過ごしやすい気温になりましたが、薪ストーブを焚くと気持ちよく、お茶を飲んでから60分ほど本を読むのが楽しみです。朝食はヨーグルトと野菜ジュース

(もう2年ほど続いています) 洗顔、歯磨きを終わたら8時ごろから外で作業開始、今日は倒木の整理と薪割りを行いました。ログハウスの前には二本の桜(山桜 八重)があり、5月初旬に満開になっていたと思われます。誰も居なくても、そこで咲いている桜を今年も見ることが出来ました。

9時まえには尾方さんが到着、作業の打ち合わせをします。5月病なのか?あまりやる気が起きない二人でした。それでも、こつこつやろうと、頑張っています。

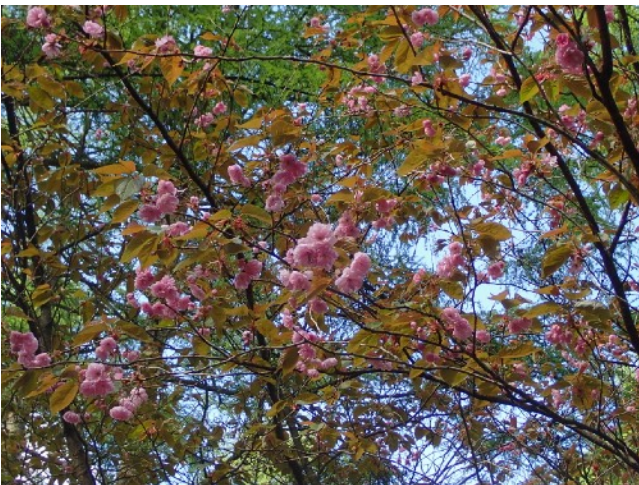

ロフトに使う間柱を確認したところ、厚さ 幅 が3種類有ることが分かり、類別に並べて本数を確認してつかう材料を決めました。5mm単位で寸法が違っているので間違えて使用すると床が平らになりません。手作りの手間がかかるところです。断熱材にも厚みの違いがあり、翌日はこの違いでやり直すことになってしまいます。下の写真は梁の間に床を設置している様子です。



尾方さんがロフトの設置、その間に私は天井と壁に断熱材を貼っていきます。断熱材はかなりの高級品で、厚みが最大145mmもありました。寒冷地仕様ですね! 15時ごろには8畳ほどのロフトが出来上がりました。今日の作業はこれで終了。

天気が良く、陽も伸びたので18時ごろでも外は明るく気持ちのいい夕焼けでした。



5月16日(木) 5時40分起床 外気10℃ 室内20℃ 曇りのちはれ

朝の日課はお茶を飲みながらの読書と朝食、洗面、朝活(この日は場内散歩と倉庫整理) 8時50分頃に尾方さんが来たので、作業を再開しました。

ロフトから落下しないように柵作り、断熱材、そして壁(OSB材)の設置を行います。



断熱材はかなり厚みがあるので、天井に貼った物は厚みがありすぎて、OSB材が設置できない状況になってしまいました。強く押さえつけても縮まらないので、致し方なく全部撤去して壁面に張り替え作業を行いました。やり直しは大変ですけど、気持ちを切り替えて手を動かすしかありません。OSB材を一面だけ設置してみました。これで次回は作業がはかどることでしょう。

15時に作業終了、計画では17日まで作業予定でしたが、尾方さんに用事が出来たので今回はココまでとして、後片付けして帰宅となりました。



荷物を積み込んで16時30分に山荘を出発、この時間だと甲府付近で夕方のラッシュに巻き込まれるので、帰り道は須玉～一宮御坂まで中央高速を利用して、時間短縮しました。そのおかげで20時10分には松田まで帰ることが出来ました(3時間40分) 60分は早く帰りました。



5月18日は春のキッズフェスタ(NYC)でアウトドアチャレンジのブースを運営します。次回のワークキャンプは5/29～30 電気工事と生コン打ち、林道整備

6/10～12 6/24～26 ホール建築の続きを行う予定です。皆様のご協力をお願いします。
